

PROPOSAL

SIMPAC 인사시스템 재구축 프로젝트 착수보고서

사람과 기술이 함께하는 미래형 HR 패키지 JaDE

SUBMISSION

2026년 9월 7일

JaDE by HCG



프로젝트 개요

SIMPAC 인사시스템 재구축 프로젝트의 개요는 다음과 같음

SIMPAC JaDE 인사시스템 재구축

사람과 기술이 함께하는 미래형 HR 패키지 JaDE

수행기간

2026.09.07 → 2026.12.18

총 15주

안정화 3주 포함

03 구현 범위

JaDE 기본 패키지 범위



인사/조직관리



근태관리



급여/퇴직관리



세무관리



연말정산관리



평가관리



교육관리



신청관리
및 모바일

데이터 이관

- 법인통합 데이터 마이그레이션
- 법인통합 설정 통합

TOTAL **4** M/M

CUSTOM 개발

TOTAL **0.5** M/M

추진조직 및 일정

추진일정

SIMPAC 인사시스템 재구축은 2026.09.07 ~ 2026.12.18 (총 15주) 일정으로 진행하며, 2026.11.30 시스템 오픈 예정임


		시스템 구축 (12주)												안정화(3주)		
단계	상세 활동	2026. 09				2026. 10				2026. 11				2026. 12		
		1W	2W	3W	4W	5W	6W	7W	8W	9W	10W	11W	12W	13W	14W	15W
프로젝트 준비	서버 구축 · JaDE 4.0 세팅	09.07~09.11														
	kickoff · 수행계획 공유	09.07~09.11														
소스전환 3.0→4.0	JaDE 4.0 소스 전환		09.14~10.02													
	전환 기능 검증					10.06~10.16										
마이그레이션	기초자료 점검 및 표준 수립	09.07~09.18														
	인사 / 시스템 이관 · 설정 통합		09.21~10.08													
	근태 이관 · 설정 통합					10.12~10.23										
	급여 / 세무 / 정산 이관 · 설정 통합							10.26~11.06								
	교육 / 평가 / 신청 / 기타 이관 · 설정 통합									11.09~11.13						
통합 로그인	SSO · 다법인 겸직자 통합로그인 개발					10.12~10.23										
	통합 로그인 테스트							10.26~11.06								
기타 연동	API 연동 · 테스트						10.19~10.30									
	출퇴근기록기 연동 · 테스트								11.02~11.20							
통합테스트 안정화	통합테스트											11.16~11.27				
	안정화 지원													12.01~12.18		

GRAND OPEN

추진조직 및 일정

추진조직

HCG는 프로젝트의 성공적 수행을 위하여 **최상의 경력을 갖춘 전문인력**을 투입하여 가장 Qualified 된 팀을 구성할 것임

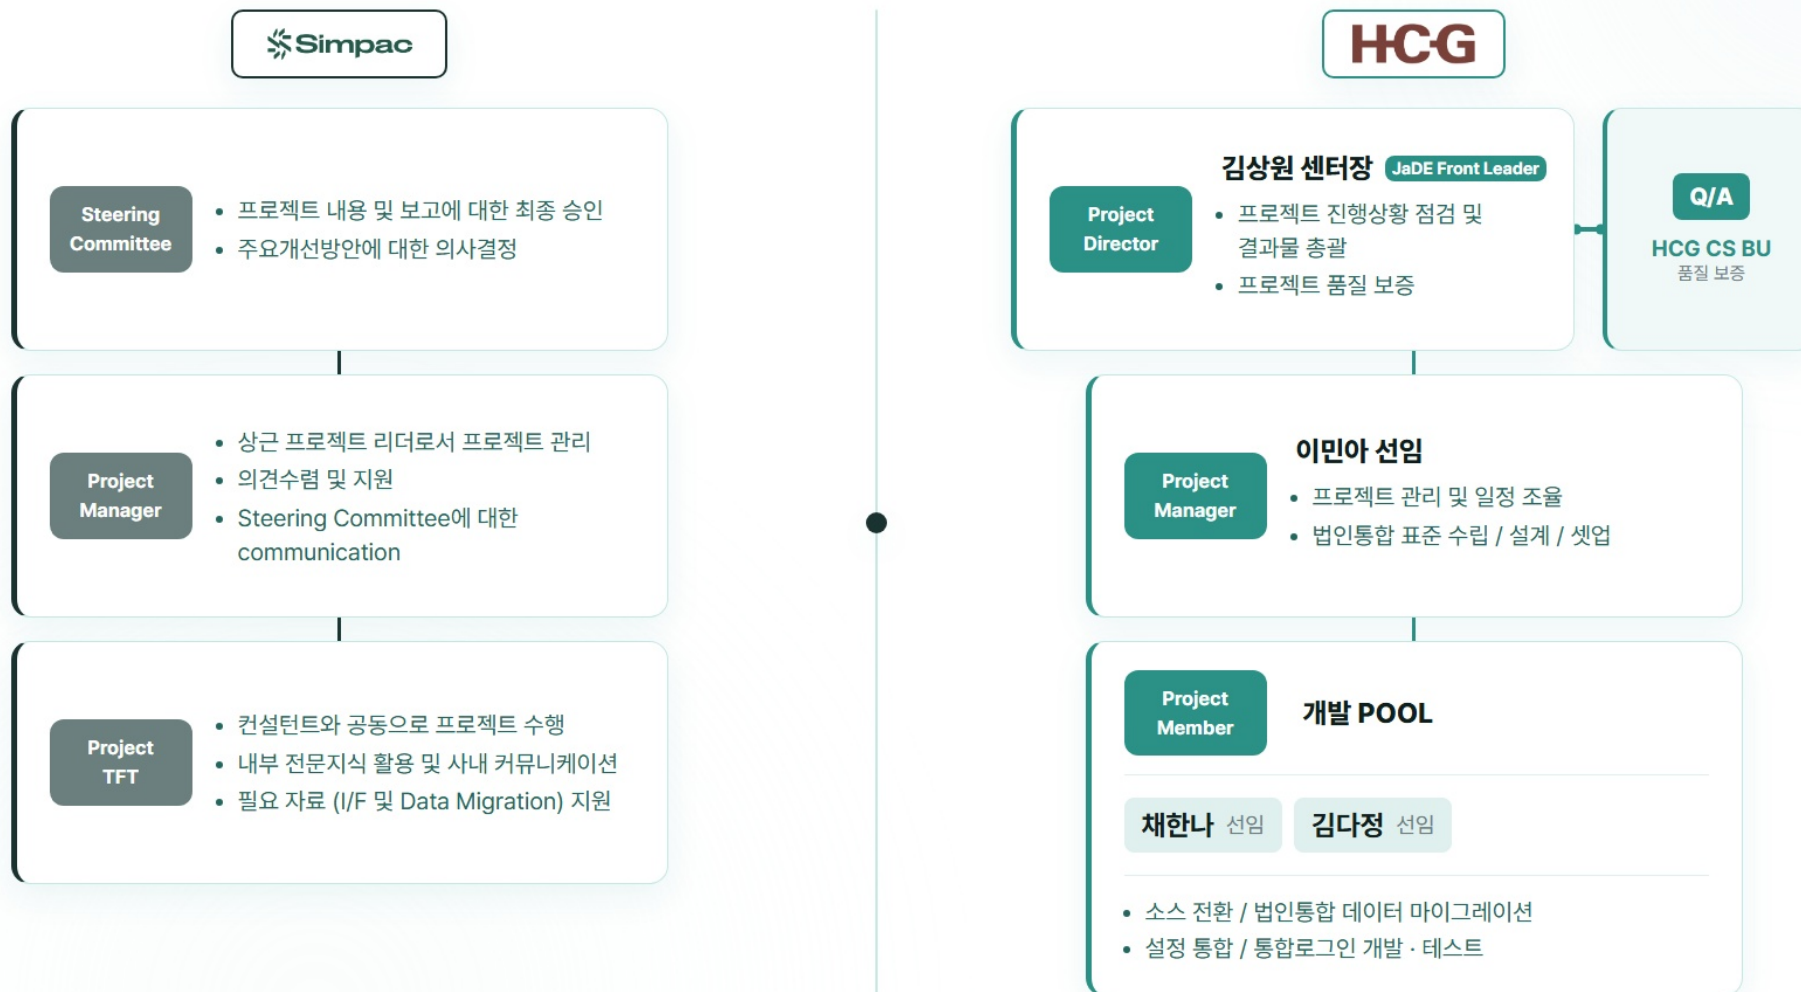

데이터 이관 방안

현재 SAAS 공용 환경에서 운영 중인 **심팩 7개 회사코드**를 전용 서버로 이전하고 **단일 회사코드(2209010)**로 통합함.
데이터는 기존 시스템에서 그대로 옮겨 담는 방식으로, 별도의 자료 수집·입력 작업은 발생하지 않음

↗ 하나로 합쳐지는 것

통합

- 회사코드 7개 → 1개(2209010) · 로그인 단위 통합
- 인사·근태·급여 데이터의 저장 위치
- 조직도 — 최상위 (주)심팩 아래 법인 7개 재배치
- 중복되는 사번·조직ID·근태/급여 코드 체계

🔒 그대로 유지되는 것

변경 없음

- 법인코드 10개 — 변경 없이 그대로 유지
- 4대보험·원천세·전표 — 법인별로 계속 분리
- 법인 간 전적 이력 — 동일인도 법인별 사번 유지
- 과거 급여·근태·평가 이력 데이터 전 건

📈 마이그레이션 진행 단계

WBS 기준 · 2026.09.07 ~ 11.13 | 이후 통합테스트 11.16 ~ 11.27 · 안정화 12.01 ~ 12.18

1

공동

기초자료 점검·표준 수립

점검·표준 09.07 ~ 09.18

중복 사번·조직·코드 실측 결과를 확인하고
정비 기준을 확정

2

HCG

인사·시스템 이관

이관 09.21 ~ 10.08
점검·설정 통합 09.28 ~ 10.08

인사기본·발령·조직 및 공통코드·권한 등
기준정보

3

HCG

근태 이관

이관 10.12 ~ 10.23
점검·설정 통합 10.19 ~ 10.23

근무조·근무유형·근태 실적 및 연차내역

4

HCG

급여·세무·정산 이관

이관 10.26 ~ 11.06
점검·설정 통합 11.02 ~ 11.06

급여·상여 지급내역, 세무·연말정산 자료

5

HCG

교육·평가·신청·기타 이관

이관 11.09 ~ 11.13
점검·설정 통합 11.11 ~ 11.13

교육 이수·평가결과·전자결재·신청내역 등
잔여 영역

사번 변경

291 명 (재채번 53)

조직 ID 변경

283 개

근태 코드

325 건

급여 코드

1,486 건

공통코드 명칭 충돌

234 건

! **법인통합의 성패는 ① 기초자료 점검·표준 수립(09.07 ~ 09.18)에서 갈립니다.** 중복 사번·조직·코드 정비안이 이 구간에 확정되지 않으면 이후 모듈별 마이그레이션이 순차로 밀립니다. 각 모듈의 **점검·설정 통합** 구간은
고객사 확인이 병행되며, 원본은 그대로 보존한 상태에서 옮기므로 정비 내용이 바뀌면 **몇 번이든 다시 이관**할 수 있습니다

데이터 마이그레이션 범위

현행 SAAS 에서 운영 중인 **심팩 7개 회사코드의 운영 데이터 일체**를 전 기간 · 전 건 그대로 이관함. 신규 구축과 달리 별도의 자료 수집 · 엑셀 입력 작업은 발생하지 않으며, 중복 사번 · 조직 · 코드에 대한 **정비 확정만** 필요함

데이터 유형	설명	이관 범위	이관	비고
인사기본정보	사원의 기본 인적사항 · 재직 · 퇴직 정보	전 기간 · 전 인원 (퇴직자 포함)	전 건	사번 291명 변경 사번 변경에 따른 인사시스템 전체 데이터 변경 대상
인사세부정보	발령 · 가족 · 경력 · 학력 등 부가정보	전 발령 이력 · 전 건	전 건	발령이력 그대로 유지
현재조직정보	조직도 기준 조직정보 · 조직장	전 조직 283개	전 건	최상위 (주)심팩 신규 · 법인 7개 2레벨 재배치
조직이력	조직 변경 HISTORY	전 이력	전 건	조직ID 변경 반영
연차내역	연차 부여 · 사용 · 잔여 내역 및 축진	전 기간 · 전 건	전 건	개인별 잔여일수 일치 검증 대상
근무정보	근무조 · 근무유형 · 출퇴근 · 근로시간 실적	전 기간 · 231만 행	전 건	근태 코드 325건 정비 후 이관
보상/수당이력	사원별 보상 · 수당 히스토리 내역	전 기간 · 전 건	전 건	
평가결과	평가 진행 · 최종등급 데이터	전 이력 · 5.4만 행	전 건	평가 코드는 법인별 분리 후 이관

별도 표기가 없는 한 **현행 시스템에 쌓인 데이터를 전 기간 · 전 건 그대로 이관**합니다. 고객사는 자료를 새로 모으는 것이 아니라, 중복된 사번 · 조직 · 코드를 어떻게 정리할지 **정비 기준만 확정**하면 됩니다

데이터 마이그레이션 범위

현행 SAAS 에서 운영 중인 **심팩 7개 회사코드의 운영 데이터 일체**를 전 기간 · 전 건 그대로 이관함. 신규 구축과 달리 별도의 자료 수집 · 엑셀 입력 작업은 발생하지 않으며, 중복 사번 · 조직 · 코드에 대한 정비 확정만 필요함

데이터 유형	설명	이관 범위	이관	비고
연봉정보	사원별 연봉계약 정보	전 기간 · 전 건	전 건	급여계산 · 퇴직금 산정 근거
급여정보	급여 · 상여 지급내역(급여대장)	전 기간 · 78.7만 행	전 건	급여 코드 1,486건 정비 후 이관
급여계좌정보	사원별 급여이체 계좌정보	전 건	전 건	
사회보험자격	4대보험 자격 · 고지내역	전 기간 · 전 건	전 건	법인별 분리 유지 — 검증 항목
퇴직금 계산내역	퇴직금 · 퇴직연금 계산내역	전 기간 · 퇴직자 포함	전 건	
연말정산 · 원천징수	연말정산 입력자료 및 원천징수 신고내역	전 기간 · 전 건	전 건	생성 PDF 포함
교육과정 · 이수내역	교육과정 마스터 및 사원별 이수내역	전 기간 · 전 건	전 건	교육코드는 겹침 없어 그대로 병합
전자결재 · 신청내역	결재 완료된 신청서 및 결재이력	전 기간 · 전 건	전 건	진행 중 문서는 컷오버 전 마감 필요

이관 제외 범위 — ① 일부 첨부파일(생성된 급여명세서 PDF 등 심팩 자료로 식별되지 않는 문서) · ② 시스템 사용 로그(접속 · 변경 · 배치 로그) · ③ 데이터 정제 결과에 따라 이관이 불가한 데이터(매핑 미확정 · 원본 손상 등)

감사합니다.

JADE by **HCG**

 **Simpac**
