

PROPOSAL

SIMPAC 인사시스템 재구축 프로젝트 착수보고서

사람과 기술이 함께하는 미래형 HR 패키지 JaDE

SUBMISSION

2026년 9월 7일

JaDE by HCG



AGENDA

CHAPTER 1 OF 2



프로젝트 수행 개요

01 프로젝트 개요 02 →

02 추진조직 및 일정 04 →

03 수행사 소개 06 →

04 제안시스템 JaDE 소개 10 →

프로젝트 개요

SIMPAC 인사시스템 재구축 프로젝트의 개요는 다음과 같음

SIMPAC JaDE 인사시스템 재구축

사람과 기술이 함께하는 미래형 HR 패키지 JaDE

수행기간

2026.09.07 → 2026.12.18

총 15주

안정화 3주 포함

03 구현 범위

JaDE 기본 패키지 범위



인사/조직관리



근태관리



급여/퇴직관리



세무관리



연말정산관리



평가관리



교육관리



신청관리
및 모바일

데이터 이관

- 법인통합 데이터 마이그레이션
- 법인통합 설정 통합

TOTAL **4** M/M

CUSTOM 개발

TOTAL **0.5** M/M

프로젝트 구현범위

JaDE PACKAGE에서 제공하는 표준기능 (조직/인사/근태/급여/퇴직/세무/정산/평가/교육/신청)을 기반으로 JaDE 4.0 소스 전환과 법인통합 데이터 마이그레이션 · 설정 통합을 수행하며, 다법인 겸직자 통합로그인을 제공함



추진조직 및 일정

추진일정

SIMPAC 인사시스템 재구축은 **2026.09.07 ~ 2026.12.18 (총 15주)** 일정으로 진행하며, **2026.11.30** 시스템 오픈 예정임


		시스템 구축 (12주)												안정화(3주)		
단계	상세 활동	2026. 09				2026. 10				2026. 11				2026. 12		
		1W	2W	3W	4W	5W	6W	7W	8W	9W	10W	11W	12W	13W	14W	15W
프로젝트 준비	서버 구축 · JaDE 4.0 세팅	09.07~09.11														
	kickoff · 수행계획 공유	09.07~09.11														
소스전환 3.0→4.0	JaDE 4.0 소스 전환		09.14~10.02													
	전환 기능 검증					10.06~10.16										
마이그레이션	기초자료 점검 및 표준 수립	09.07~09.18														
	인사 / 시스템 이관 · 설정 통합		09.21~10.08													
	근태 이관 · 설정 통합					10.12~10.23										
	급여 / 세무 / 정산 이관 · 설정 통합							10.26~11.06								
	교육 / 평가 / 신청 / 기타 이관 · 설정 통합									11.09~11.13						
통합 로그인	SSO · 다법인 겸직자 통합로그인 개발					10.12~10.23										
	통합 로그인 테스트							10.26~11.06								
기타 연동	API 연동 · 테스트						10.19~10.30									
	출퇴근기록기 연동 · 테스트								11.02~11.20							
통합테스트 안정화	통합테스트											11.16~11.27				
	안정화 지원													12.01~12.18		

GRAND OPEN

추진조직 및 일정

추진조직

HCG는 프로젝트의 성공적 수행을 위하여 **최상의 경력을 갖춘 전문인력**을 투입하여 가장 Qualified 된 팀을 구성할 것임

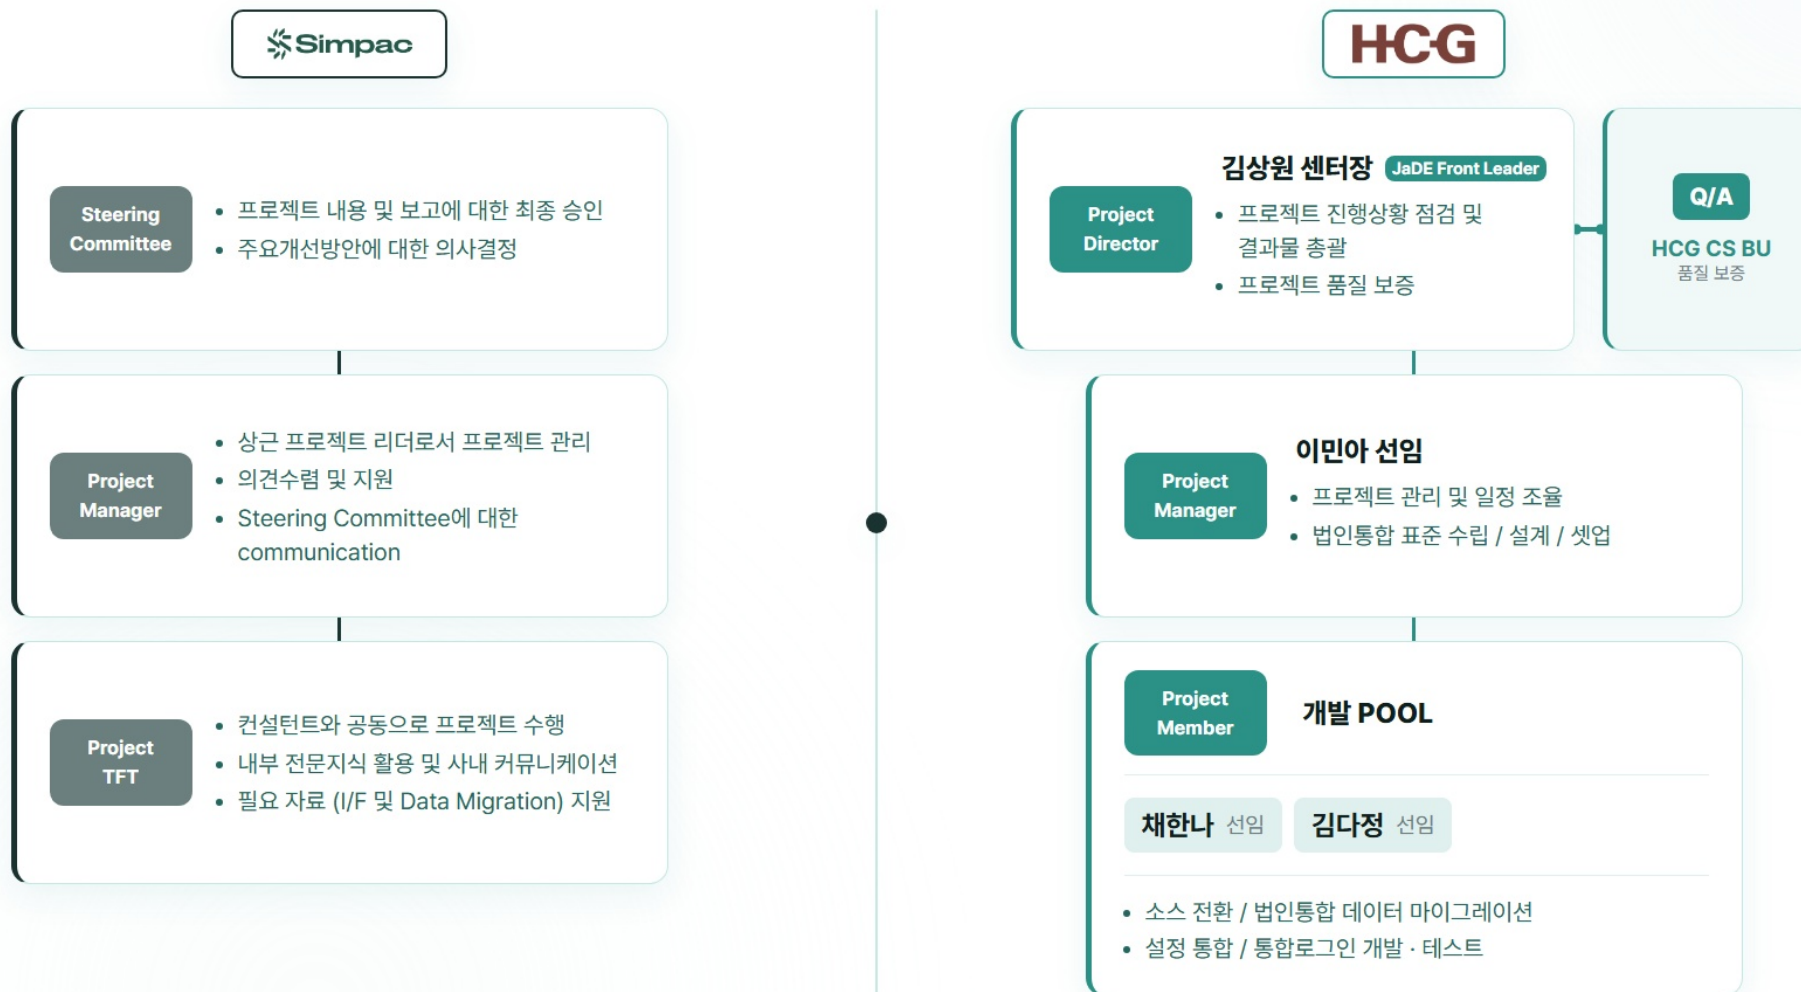

수행사 소개

주요 현황

HCG는 2001년 설립 이래 국내 기업 환경 이해와 인사·조직 전문성에 기반하여 HR Consulting, e-HR Solution, Payroll Outsourcing Service 등 HR 전 영역에 걸친 수준 높은 통합 서비스를 통해, 고객의 궁극적인 비즈니스 전략 실행과 성공을 지원하는 국내 최고의 **HR Total Solution Provider**임

HCG

국내 최대의 인사/조직 컨설팅 및 인사시스템 전문기업

서비스 제공기간

25

년

2001년 1월 법인설립

고객 기업 수

875

개사

국내 유수 대기업 및 중견기업

HR 솔루션 이용자

68

만명

HR 전문인력

236

명
HR Consulting, e-HR Solution,
Payroll Outsourcing, SM

MISSION & STRATEGY

Make the Business Strategy Work Through HR Total Solution


HR SOLUTION LINE-UP

hunel JADE **talenx.**

수행사 소개

조직 및 인원

HCG는 컨설팅, 솔루션, 아웃소싱, 지원조직으로 구성되어 있으며, 2025년 12월 현재 **236명의 전문인력**이 수준 높은 HR 서비스를 제공하고 있음

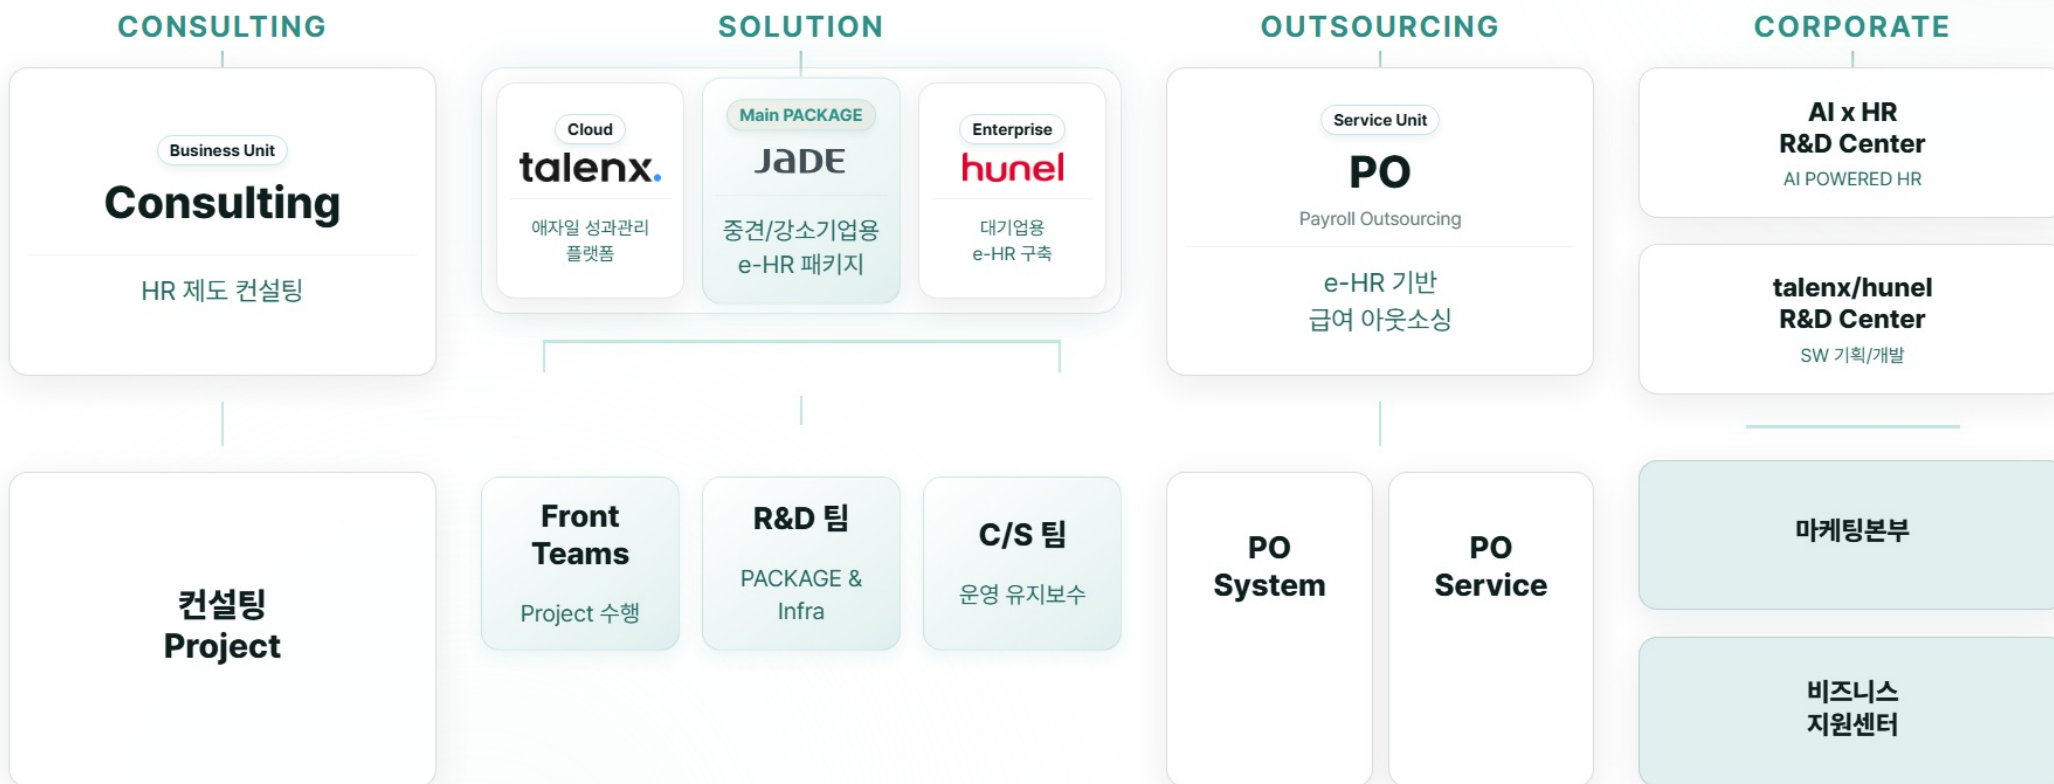


수행사 소개

통합 역량 체계

HCG는 HR 제도 컨설팅 전문가, 인사팀 출신 Implementation 전문가, System 개발자 등 **HR 영역의 각 전문가 집단**으로 구성되어 있으며, 조직 및 업무 집단 간 **유기적인 협업**을 통하여 **최신 HR Trends**와 **현장 인사이트**를 시스템에 **지속적으로 반영**하고 있음

HR 전 영역 전문가 집단의 유기적 협업 체계

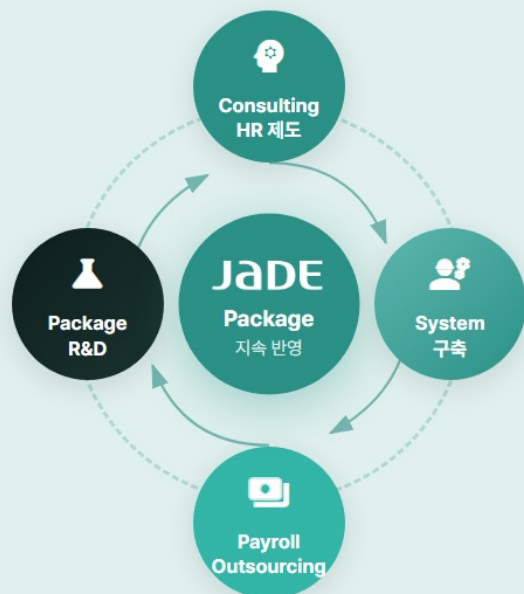

↻ 현장 경험 + Best Practice = 시스템 내재화

✓ HR 전 영역 전문가 집단의 유기적 협업

- ✓ HR 각 영역의 전문가 집단이 조직 및 업무 간 **유기적인 협업 체계**를 구축
- ✓ HR 제도 컨설팅 전문가, 인사팀 출신 Implementation 전문가, 데이터 분석가 등 **통합적인 역량**을 지원

✓ 현장 경험과 Best Practice의 시스템 내재화

- ✓ **Service & System** HR 트렌드 연구 및 업무별 프로세스 연구로 도출된 개선 과제를 시스템 기능에 반영
- ✓ **Payroll Service** 서비스 수행 중 수집된 급여, 세무, 연말정산의 실무적 **Insight**를 패키지에 즉시 적용
- ✓ 각 프로젝트 수행 과정에서 수집된 **Best Practice**를 공유/표준화하여 시스템을 지속적으로 **상향 평준화**

✓ 지속 가능한 성장을 위한 정기 개선 로드맵

- ✓ **Package R&D** 컨설팅과 시스템 구축 현장에서 수집한 **트렌드** 및 **사례별 적용 방법론**을 지속적으로 연구
- ✓ 일회성 구축에 그치지 않고, 연구된 결과를 바탕으로 **정기적인 시스템 개선 로드맵**을 제공

HCG는 창립 이후 **875여개 고객사**를 대상으로 다양한 영역의 컨설팅 및 시스템 구축 프로젝트를 성공적으로 수행함



제안시스템 JaDE 소개

SIMPAC의 인사시스템 재구축을 위해 **JaDE PACKAGE의 표준 기능**을 최대한 활용하고, 추가로 필요한 기능 및 인터페이스에 대해서는 **요건 분석을 통한 커스터마이징**을 진행함

조직/인사

- 조직관리
- 인사기본정보 관리
- 인사발령 및 히스토리
- 임직원 명부
- 각종 인사현황 및 인사이트
- 제증명 관리
- 동의서 관리

근태관리

- 근태종류/유형관리
- 근무조/근무계획
- 출퇴근/지각 관리
- 시간외근무신청
- 주52시간 집계
- 연차 및 보상관리
- 근태 통계/현황

급여관리

- 급여기준/연봉관리
- 급여대장/계산식
- 월급여계산(소급포함)
- 퇴직금/퇴직충당금
- 급여명세서 발송
- 급여통계/현황
- 4대보험 신고

세무관리

- 원천징수이행상황신고
- 사업소득/기타소득
- 일용직 소득관리
- 이자/배당 소득관리
- 지급명세서 전자신고
- 지방세 신고자료

연말정산

- 정산기초자료 관리
- 국세청 간소화자료
- 인적공제/소득공제
- 연말정산 결과조회
- 원천징수영수증 출력

평가관리

- 평가군/KPI Pool
- 평가대상자/평가자 설정
- 목표합의/진행관리
- 실적/역량/다면평가
- 평가결과 조정/확정
- 평가결과 조회

교육관리

- 교육체계/과정관리
- 교육이력 관리
- 교육신청/승인
- 사내/사외 위탁교육
- 교육만족도 설문

신청/승인

- 제증명 신청
- 복리후생 신청
- 휴가/근태 신청
- 전자결재 연동
- 승인/반려 처리

ESS (Self-Service)

- 나의 인사정보 조회
- 급여명세서 조회
- 근태/휴가 현황
- 각종 신청 현황
- 평가 본인작성
- 모바일 환경 제공


시스템 관리

- 사용자/권한 관리
- 메뉴/프로그램 관리
- 공통코드 관리
- 공지사항
- 접속로그/감사
- 시스템 환경설정

제안시스템 JaDE 소개

완성형 패키지

JaDE는 HCG의 HR 시스템 구축 노하우를 집약한 BEST PRACTICE 기반 완성형 HR PACKAGE로, **시스템 완성도, 안정성, 빠른 도입** 세 가지 핵심 가치를 동시에 제공함



✓ 시스템 완성도

- ✓ 조직/인사/근태/급여/세무 등 HR 전 영역을 아우르는 **600여 개 표준 메뉴** 및 프로세스 완비
- ✓ HCG의 컨설팅 및 구축 경험이 집약된 **Best Practice 표준 로직** 탑재, 데이터 정합성 보장
- ✓ 단순 데이터 관리를 넘어 **복잡한 연계 업무까지** 커버하는 완성형 아키텍처 보유

✓ 시스템 안정성

- ✓ 이미 완성된 패키지를 통해 **오류 없이 원형 그대로 바로 사용 가능한 구조**
- ✓ 신규개발(SI) 대비 발생 가능한 **프로그램 오류 및 로직 결함 리스크 원천 제거**
- ✓ 다양한 직군/직무/평가 체계 등 **검증된 시나리오 기반**의 안정적인 시스템 구동

✓ 빠른 도입

- ✓ 바닥부터 개발하는 방식이 아닌, **완성된 패키지 Setup 적용**으로 구축 기간 획기적 단축
- ✓ 업무 공백이나 안정화 기간 없이, **시스템 오픈 당일**부터 즉시 현업 업무 처리 가능
- ✓ **표준 템플릿과 방법론** 활용, 실패 없는 프로젝트 수행 및 빠른 가동 실현




완성도 + 안정성 + 빠른 도입

제안시스템 JaDE 소개

독보적인 인사이트 제공

JaDE는 단순 데이터 관리를 넘어, HCG의 **HR 컨설팅 노하우가 내재된 인사이트 기능**을 통해 경영진의 데이터 기반 의사결정을 지원하고, 인사 담당자부터 경영진까지 **각 역할에 최적화된 분석 환경**을 제공함

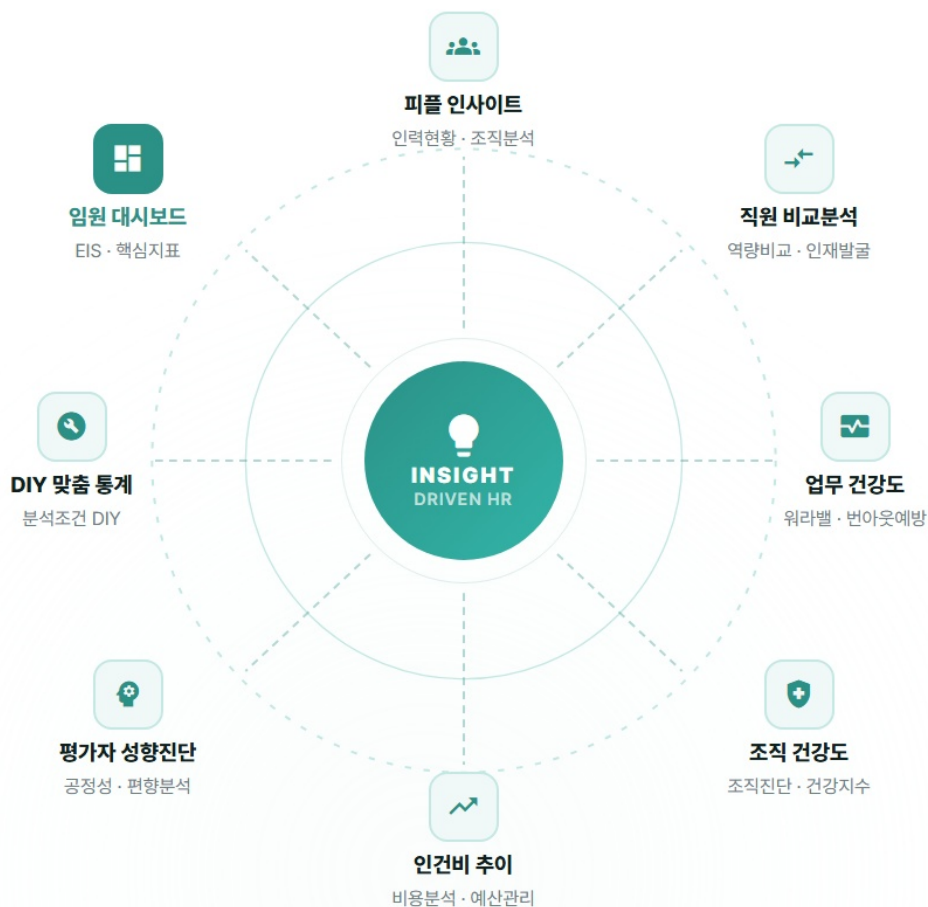

컨설팅 노하우 내재화

- ✓ HCG가 수백 개 기업에서 축적한 **HR 컨설팅 프레임워크**를 시스템에 내재화
- ✓ 평가 편향 진단, 핵심인재 역량 분석, 번아웃 위험도 등 **HR 컨설팅 관점의 진단 지표**를 제공

데이터가 말하는 HR

- ✓ 조직 건강도, 인건비 추이, 이직 동향 등 **선제적 인사 의사결정**을 위한 데이터 분석 제공
- ✓ 직원별 커리어 타임라인 등 **개인 단위 심층 분석** 지원

역할별 맞춤 대시보드

- ✓ 경영진 전용 EIS 대시보드, HR 담당자 분석 도구 등 **역할에 최적화된 화면** 제공
- ✓ DIY 맞춤 인사통계 기능으로 **사용자가 직접 분석 조건을 설정하여 활용**

제안시스템 JaDE 소개

유연한 확장성

JaDE는 약 590여개의 다양한 세팅을 기반으로 복잡한 인사 제도와 급여 체계의 유연한 변화 대응이 가능하며, 특화된 요구사항에 대해서는 커스터마이징까지 지원하여 딱 맞는 HR 시스템 환경을 제공함

JaDE Configuration

근로유형 세팅

출퇴근 처리 방법
계획시간보다 늦게 출근, 일찍 퇴근하는 경우에만 제어

휴일근로 시 보상처리 방법
휴일대제 보상휴가 적립 수당으로 지급

사전근무신청 운영여부

근무계획 당일 수정 가능여부

급여항목 세팅

급여소득 활용여부

통상임금 자동산정

명세서에 지급금액 숨김 여부

일일계산 방식
실근무일 기준

평가항목 세팅

평가 종료 후 일반 사원에게 결과 공개여부

평가 종료 후 일반 사원에게 피드백 공개 여부

평가 캘리브레이션 진행 여부

캘리브레이션 등급 조정범위
#1스텝

신청항목 세팅

셀프결재 가능여부

첨부파일 필수여부

결재차수 기준
조직도 기준

의견등록 시 알림 발송 여부

590+ 다양한 셋업 기능

다양한 셋업 기능을 즉시 활용하여 불필요한 개발을 줄이고 커스터마이징 범위를 최소화합니다.

🔥 커스터마이징

기업 고유의 특화 프로세스는 협의된 범위 내에서 커스터마이징을 지원하여 합리적인 구축을 제안합니다.

⚙️ 대응력 확보

- ✓ 영역별 200여 개 세팅 처리 및 390여 개 환경변수 등 업계 최고 수준의 설정 기능 보유
- ✓ 코딩 수정이 아닌, 검증된 세팅변경을 통해 복잡한 급여/근태 규칙 및 잦은 제도 변화 수용
- ✓ 담당자가 직접 관리 가능한 설정 환경을 제공하여 운영 유연성 및 즉시 대응력 강화

🔧 커스터마이징 최소화

- ✓ 완성된 패키지의 강력한 셋업 기능을 우선 적용하여 불필요한 커스터마이징 최소화
- ✓ 소스 코드 수정을 줄이고 표준 기능을 활용함으로써 시스템 구축 기간 단축 및 오류 차단
- ✓ 패키지 업그레이드 및 유지보수 용이성을 고려한 표준 준수 지향

⚙️ 추가 개발 지원

- ✓ 방대한 세팅 범위를 벗어나는 고유의 특화 프로세스에 대해서는 유연한 커스터마이징 수행
- ✓ 기존 레거시 시스템과의 인터페이스 및 표준 API 범위를 넘어서는 연동 요건 지원
- ✓ '커스터마이징 최소화' 와 '특화 기능 구현'의 조화를 통해 합리적 시스템 구축

제안시스템 JaDE 소개

수행인력 전문성

JaDE의 구축 프로젝트는 **인사팀 실무 출신의 전문 컨설턴트(JaDE Implementation Consultant)**가 운영조건 분석, 세팅, 테스트, 교육 등 프로젝트 과정을 직접 수행하여 전문성에 기반한 프로젝트 리딩을 진행함



✓ 인사팀 출신 J.I.C 투입

- ✓ 인사팀 실무 경험을 보유한 구축 전문 컨설턴트가 프로젝트 전담 수행
- ✓ 취업규칙과 인사 규정을 심도 있게 분석, 제도 기반의 시스템 세팅 진행
- ✓ 현업의 고충을 이해하는 전문가가 투입되어 실무적인 조언과 가이드 제공

✓ 효율적인 프로젝트 리딩

- ✓ 현업 담당자와 동일한 눈높이와 용어로 소통, 요구사항 왜곡 및 시행착오 방지
- ✓ HCG의 Best Practice 기반으로 프로세스를 제안하고 리딩
- ✓ 업무 분석부터 세팅, 테스트까지 밀착형 프로젝트 관리 수행

✓ 맞춤형 교육 및 안정화 지원

- ✓ 고객사 업무 시나리오 기반 담당자 대상 맞춤형 모듈 교육 수행
- ✓ 시스템 오픈 초기 안정적인 운영 가이드 및 체크리스트 제공
- ✓ 실습 기반 사용자 검수 절차를 통해 완벽한 시스템 운영 이전 실현

AGENDA

CHAPTER 2 OF 2



프로젝트 수행 방안

- 01 프로젝트 수행 프로세스 16 →
- 02 업무분석 수행 방안 17 →
- 03 데이터 이관 방안 18 →
- 04 추가 개발 처리 방안 21 →
- 05 테스트 방안 22 →
- 06 산출물 및 보고 방안 23 →
- 07 유지보수 방안 24 →
- 08 프로젝트 진행 리스크 관리 26 →


시스템 구축 방안

고객 요구사항을 Fit/Gap 방식으로 검토하여 표준 패키지와 추가 개발 범위를 명확히 정의하고, **일관되고 예측 가능한 6단계 표준 프로세스**를 통해 수행함



업무분석 수행 방안

업무 분석은 세팅 가이드를 위한 **제도 분석**과 개발 요청 사항에 대한 **세부 분석**으로 나뉘어 진행함. 제도 분석은 사전 분석자료 참고 후, 분석, 세팅, 교육의 순서로 진행되며, 개발 분석은 계약 전 확정된 요구사항정의서 및 프로젝트 도중 발생하는 추가개발 요청 사항에 대하여 업무분석, 설계, 개발의 순서로 진행함.

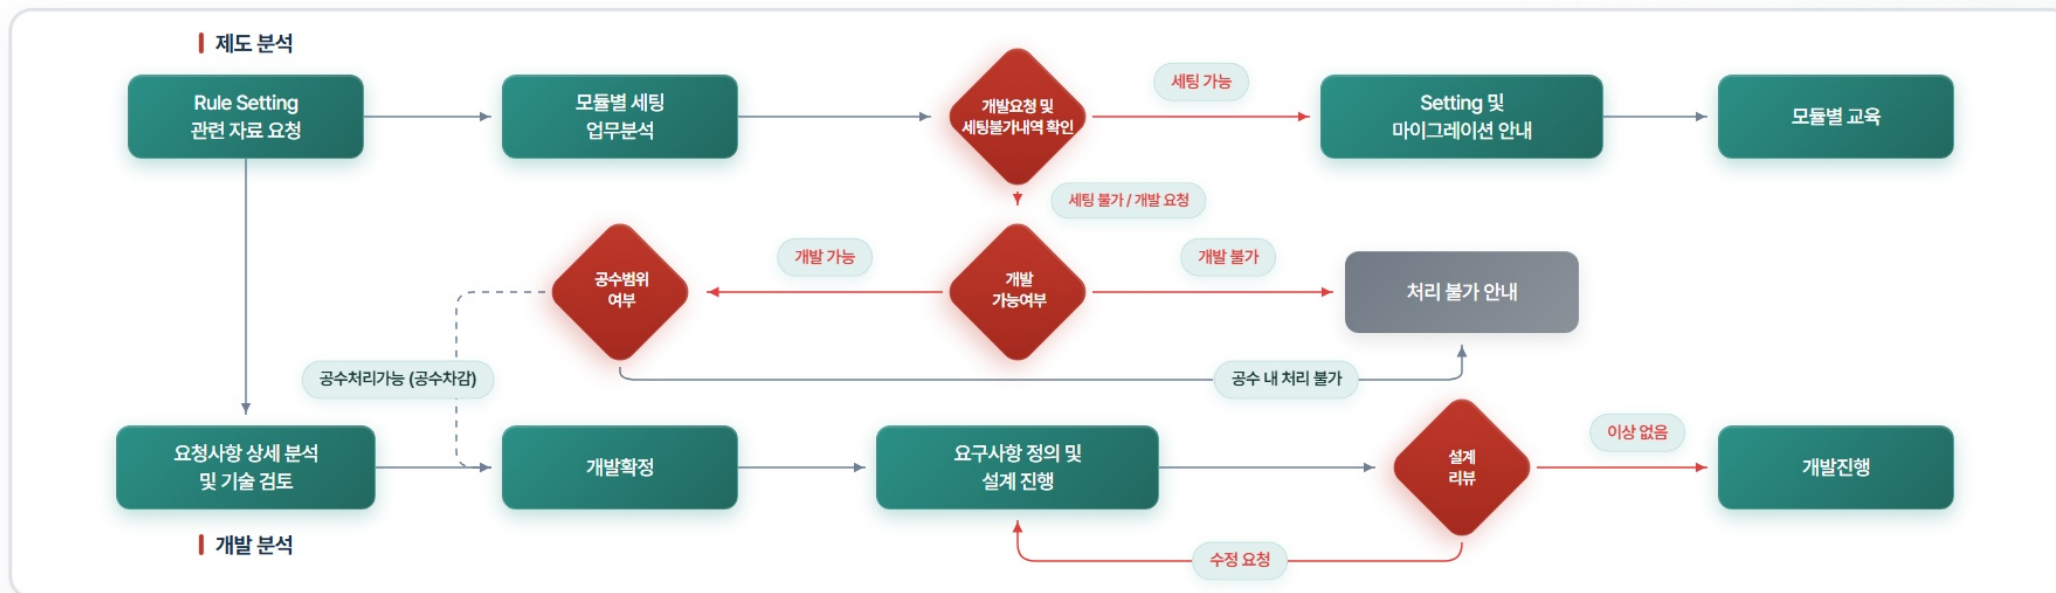

- 업무분석은 모듈 별 기준 Setting을 위한 제도 분석과 제안요청 시 RFP 요청건에 대한 개발 분석으로 나뉘어 진행함
- 제도 분석은 패키지 기준 Setting 가능 여부 및 최적 Setting값을 도출하기 위한 과정임.
- 주요 기능 별로 Rule에 대한 정의를 확정 후, JaDE에서 표준 Setting 등록하면 고객사에서 이를 참고하여 세부 Setting 진행.
- 제도 분석에서 Setting 으로 처리할 수 없는 부분 확인 시, 개발 가능한 부분인지 검토 후 개발분석 진행
- 개발 가능한 대상인 경우 책정 공수 범위 내에서 개발 분석 통하여 제안요청시 RFP 요청내역과 병합하여 설계/개발 진행
- 제도 분석이 완료되면, 안내에 따라 실제 Setting 작업과 DATA 마이그레이션을 진행함.

데이터 이관 방안

현재 SAAS 공용 환경에서 운영 중인 **심팩 7개 회사코드**를 전용 서버로 이전하고 **단일 회사코드(2209010)**로 통합함.
데이터는 기존 시스템에서 그대로 옮겨 담는 방식으로, 별도의 자료 수집·입력 작업은 발생하지 않음

↗ 하나로 합쳐지는 것

통합

- 회사코드 7개 → 1개(2209010) · 로그인 단위 통합
- 인사·근태·급여 데이터의 저장 위치
- 조직도 — 최상위 (주)심팩 아래 법인 7개 재배치
- 중복되는 사번·조직ID·근태/급여 코드 체계

🔒 그대로 유지되는 것

변경 없음

- 법인코드 10개 — 변경 없이 그대로 유지
- 4대보험·원천세·전표 — 법인별로 계속 분리
- 법인 간 전적 이력 — 동일인도 법인별 사번 유지
- 과거 급여·근태·평가 이력 데이터 전 건

📈 마이그레이션 진행 단계

WBS 기준 · 2026.09.07 ~ 11.13 | 이후 통합테스트 11.16 ~ 11.27 · 안정화 12.01 ~ 12.18

1

공동

기초자료 점검·표준 수립

점검·표준 09.07 ~ 09.18

중복 사번·조직·코드 실측 결과를 확인하고
정비 기준을 확정

2

HCG

인사·시스템 이관

이관 09.21 ~ 10.08
점검·설정 통합 09.28 ~ 10.08

인사기본·발령·조직 및 공통코드·권한 등
기준정보

3

HCG

근태 이관

이관 10.12 ~ 10.23
점검·설정 통합 10.19 ~ 10.23

근무조·근무유형·근태 실적 및 연차내역

4

HCG

급여·세무·정산 이관

이관 10.26 ~ 11.06
점검·설정 통합 11.02 ~ 11.06

급여·상여 지급내역, 세무·연말정산 자료

5

HCG

교육·평가·신청·기타 이관

이관 11.09 ~ 11.13
점검·설정 통합 11.11 ~ 11.13

교육 이수·평가결과·전자결재·신청내역 등
잔여 영역

사번 변경

322 명 (재채번 61)

조직 ID 변경

283 개

근태 코드

325 건

급여 코드

1,486 건

공통코드 명칭 충돌

234 건

! **법인통합의 성패는 ① 기초자료 점검·표준 수립(09.07 ~ 09.18)에서 갈립니다.** 중복 사번·조직·코드 정비안이 이 구간에 확정되지 않으면 이후 모듈별 마이그레이션이 순차로 밀립니다. 각 모듈의 **점검·설정 통합** 구간은
고객사 확인이 병행되며, 원본은 그대로 보존한 상태에서 옮기므로 정비 내용이 바뀌면 **몇 번이든 다시 이관**할 수 있습니다

데이터 마이그레이션 범위

현행 SAAS 에서 운영 중인 **심팩 7개 회사코드의 운영 데이터 일체**를 전 기간 · 전 건 그대로 이관함. 신규 구축과 달리 별도의 자료 수집 · 엑셀 입력 작업은 발생하지 않으며, 중복 사번 · 조직 · 코드에 대한 **정비 확정만** 필요함

데이터 유형	설명	이관 범위	이관	비고
인사기본정보	사원의 기본 인적사항 · 재직 · 퇴직 정보	전 기간 · 전 인원 (퇴직자 포함)	전 건	사번 322명 변경 사번 변경에 따른 인사시스템 전체 데이터 변경 대상
인사세부정보	발령 · 가족 · 경력 · 학력 등 부가정보	전 발령 이력 · 전 건	전 건	발령이력 그대로 유지
현재조직정보	조직도 기준 조직정보 · 조직장	전 조직 283개	전 건	최상위 (주)심팩 신규 · 법인 7개 2레벨 재배치
조직이력	조직 변경 HISTORY	전 이력	전 건	조직ID 변경 반영
연차내역	연차 부여 · 사용 · 잔여 내역 및 축진	전 기간 · 전 건	전 건	개인별 잔여일수 일치 검증 대상
근무정보	근무조 · 근무유형 · 출퇴근 · 근로시간 실적	전 기간 · 231만 행	전 건	근태 코드 325건 정비 후 이관
보상/수당이력	사원별 보상 · 수당 히스토리 내역	전 기간 · 전 건	전 건	
평가결과	평가 진행 · 최종등급 데이터	전 이력 · 5.4만 행	전 건	평가 코드는 법인별 분리 후 이관

별도 표기가 없는 한 **현행 시스템에 쌓인 데이터를 전 기간 · 전 건 그대로 이관**합니다. 고객사는 자료를 새로 모으는 것이 아니라, 중복된 사번 · 조직 · 코드를 어떻게 정리할지 **정비 기준만 확정**하면 됩니다

데이터 마이그레이션 범위

현행 SAAS 에서 운영 중인 **심팩 7개 회사코드의 운영 데이터 일체**를 전 기간 · 전 건 그대로 이관함. 신규 구축과 달리 별도의 자료 수집 · 엑셀 입력 작업은 발생하지 않으며, 중복 사번 · 조직 · 코드에 대한 정비 확정만 필요함

데이터 유형	설명	이관 범위	이관	비고
연봉정보	사원별 연봉계약 정보	전 기간 · 전 건	전 건	급여계산 · 퇴직금 산정 근거
급여정보	급여 · 상여 지급내역(급여대장)	전 기간 · 78.7만 행	전 건	급여 코드 1,486건 정비 후 이관
급여계좌정보	사원별 급여이체 계좌정보	전 건	전 건	
사회보험자격	4대보험 자격 · 고지내역	전 기간 · 전 건	전 건	법인별 분리 유지 — 검증 항목
퇴직금 계산내역	퇴직금 · 퇴직연금 계산내역	전 기간 · 퇴직자 포함	전 건	
연말정산 · 원천징수	연말정산 입력자료 및 원천징수 신고내역	전 기간 · 전 건	전 건	생성된 PDF 문서는 제외
교육과정 · 이수내역	교육과정 마스터 및 사원별 이수내역	전 기간 · 전 건	전 건	교육코드는 겹침 없어 그대로 병합
전자결재 · 신청내역	결재 완료된 신청서 및 결재이력	전 기간 · 전 건	전 건	진행 중 문서는 컷오버 전 마감 필요

이관 제외 범위 — ① 일부 첨부파일(생성된 급여명세서 PDF 등 심팩 자료로 식별되지 않는 문서) · ② 시스템 사용 로그(접속 · 변경 · 배치 로그) · ③ 데이터 정제 결과에 따라 이관이 불가한 데이터(매핑 미확정 · 원본 손상 등)

추가 개발 진행 프로세스

추가 개발은 계약 전 확정된 요구사항 및 프로젝트 착수 후 확인한 필요개발사항에 대하여 **상세 분석** 진행하며, 계약시 확정된 추가개발 1건 (총 10 M/D) 범위 내에서 분석/설계/개발/검수의 과정으로 진행함.

확정 추가개발 공수

1 건 = 10 M/D



확정 공수 사용 기준

확정 요건 1건

10 M/D 배정



추가 요청 발생 시

확정 공수 (10 M/D) 초과



1 M/D 는 영업일 기준 개발자 1명이 1일간 수행하는 절대적 작업량을 의미하며, 본 프로젝트 추가개발은 **1건 · 총 10 M/D** 로 확정되어 있음.

계약 상 공수인 **10 M/D 범위 내** 에서 추가/변경 개발에 대한 요청 가능하며, **업무분석 기간** 을 통하여 상세 요건 확인 후 개발 진행함.

요청 내역의 합산이 **10 M/D를 초과** 할 경우, 우선순위를 산정하여 필요사항에 대하여 **선별** 개발을 진행하고, 제외항목에 대하여는 **별도 고도화 개발** 등으로 수행함.

프로젝트 기간 내 **계약 공수를 소진하지 못한 경우**, 소멸되지 않고 프로젝트 종료 후 **유지보수 항목으로 이관** 되어 사용할 수 있음.

테스트 방안

테스트 단계는 단순 기능 점검 위주의 방식을 넘어, 실제 업무 담당자가 운영 상황 별 시나리오를 개발자 주도하에 직접 수행하는 과정을 통해 **시스템 안정성과 업무 담당자의 사용 숙련도**를 함께 점검하고 보완함

SYS 시스템 검수

- ✓ 기능 정상 작동 확인
- ✓ 세팅값 및 설정 검증
- ✓ 추가 개발 항목 테스트
- ✓ 데이터 정합성 확인

DOUBLE
CHECK
동시 검증

USER 숙련도 검수

- ✓ 담당자 직접 수행 (Hands-on)
- ✓ 부족 역량 파악 (Gap Analysis)
- ✓ 1:1 맞춤 보완 교육 (Coaching)
- ✓ 운영 시나리오 실습

검수 프로세스

1 검수 수행

시나리오 문항별로 시스템 기능과 담당자 숙련도를 동시에 점검함
컨설턴트 안내 하에 **실무자가 직접** 수행하는 방식으로 진행함

Hands-on 방식

2 Gap 파악

검수 과정에서 발견된 **부족 영역을 진단함**
시스템 이슈와 사용자 미숙지 항목을 구분하여 기록함

Gap Analysis

3 보완 교육

파악된 Gap에 대해 **1:1 맞춤 교육**을 진행함
취약 영역에 집중하여 실제 운영 상황을 가정한 실습을 수행함

1:1 Coaching

4 재검수

보완 교육 후 **동일 시나리오로 재검수**를 진행함
운영 준비 완료 상태를 최종 확인하고, 부족 시 반복 진행함

최종 확인

최종 목표 →

Ready to Run

JaDE는 뛰어난 안정성의 Package 표준을 기반으로 기능 점검은 물론 **실제 사용자의 숙련도 검수에 집중**하여 완벽한 운영 준비 태세를 보장함

프로젝트 산출물 및 보고 방안

프로젝트 구현 절차에 따른 단계별로 정의된 표준 산출물 종류는 아래와 같으며, 표준산출물을 기반으로 고객들에게 필요한 인사시스템 구축 기술과 경험의 공유를 지원하고 있음

프로젝트 단계별 산출물

1 프로젝트 준비

- 프로젝트 WBS
- 프로젝트 수행계획서

2 업무분석 및 설계

- 화면설계서 (고객 요청 시)
- 추가개발 프로그램 리스트

3 모듈 교육 및 Rule 세팅

- 모듈별 표준 매뉴얼 (고객사 관리자용)

4 개발 및 테스트

- 테스트 결과서

5 오픈 및 안정화

- 완료보고서

프로젝트 진행보고

착수 ~ 완료

- 프로젝트 수행계획서 - 착수시점에 설명 및 제출
- 프로젝트 완료보고서 - 완료시점에 진행내역 및 결과 보고

정기보고

주간 단위

- 주간보고 - 주차를 단위로 진척 및 단위기간 수행결과 보고

비정기 보고

수시

- 이슈, 리스크 발생 시 해당 내용 보고

유지보수 및 운영 방안

프로젝트 종료 후 시스템의 안정적인 운영을 위해 **HCG의 헬프데스크를 통하여 원격 유지보수를 지원**할 것이며, 시스템의 **지속적 활성화 및 Upgrade**를 위해 유상 유지보수 서비스를 제공할 계획임

프로젝트 종료 이후 유지보수 지원 방안

M1
~
M5

프로젝트 수행기간 (5개월)

* 안정화 0.5개월 포함

유상 유지보수 서비스 수행

(프로젝트 종료 후 별도 계약 필요)
- Package 유지보수, 개발유지보수 -

HCG 유지보수 지원 체계

고객과의 계약(최소 1년 단위)에 의한 서비스 수행
(상세내역은 종류 및 내용 참조)

- JaDE Package 기본 제공 기능: 별도 기간 정함 없이 무상하자보수
- 유지보수를 위해 원격접속 환경은 필수적으로 제공 되어야 함

프로젝트
종료 후
운영지원

유지보수 수행절차

- 프로그램 수정/보완 사항 발생 고객사
- HCG HelpDesk 시스템 접수 고객사
- 서비스 요청 검토 HCG
- 조치계획 수립 HCG
- 프로그램 수정/보완 HCG
- Test 실시 HCG
- 실행환경이관 요청 HCG
- 변경내역 공지 및 이관 HCG
- 서비스 요청 종료 완료

유지보수 및 운영 방안

유상 유지보수 종류 및 내용


지속적인 시스템의 업무지원 효율화 및 안정적 운영을 위한 **유상유지 보수체계**를 지원하며, **Package 유지보수** 및 고객의 필요에 따라 **선택 가능한 서비스**를 제공함

유형	주요 지원 내용	지원형태	금액기준	비고
Package & Patch	- JaDE & Bundle Tool 장애 발생시 원인분석 및 조치가이드 - 사용자 환경변화에 따른 장애 시, 조치 가이드 제공 - 시스템 기준설정 및 업무 수행을 위한 문의 지원 (연간 80man/hour 기본 서비스 시간 제공) - 보안관련 사항 업데이트 - 근로소득세 법규 변경에 따른 패치 서비스	Off-Site 지원	견적서 참조	필수 사항
개발 유지보수	- 기개발 프로그램 요건 변경에 따른 설정변경 지원 및 수정개발 - 무상하자유지보수 종료 후 JaDE package customizing 영역의 오류 발생 시 조치 - 약정공수 서비스로 M/M(Man Month)방식으로 계약되며, 계약기간 중 초과되는 지원공수는 분기 단위로 실비 정산함. (1M/M=20Manday=160hours) - 약정공수 1M/M은 최소 및 필수 약정 공수임	Off-Site 지원	약정공수 별도계약	선택 사항

* 비상주를 원칙으로, HCG HelpDesk를 통하여 지원하며, 원격지원을 위한 환경은 고객사에서 제공하여야 함

프로젝트 진행 리스크 관리

각 프로젝트 단계 별로 발생할 수 있는 리스크에 대하여, 위험도 및 프로젝트 관리에서 대처 방안을 아래와 같이 설명함

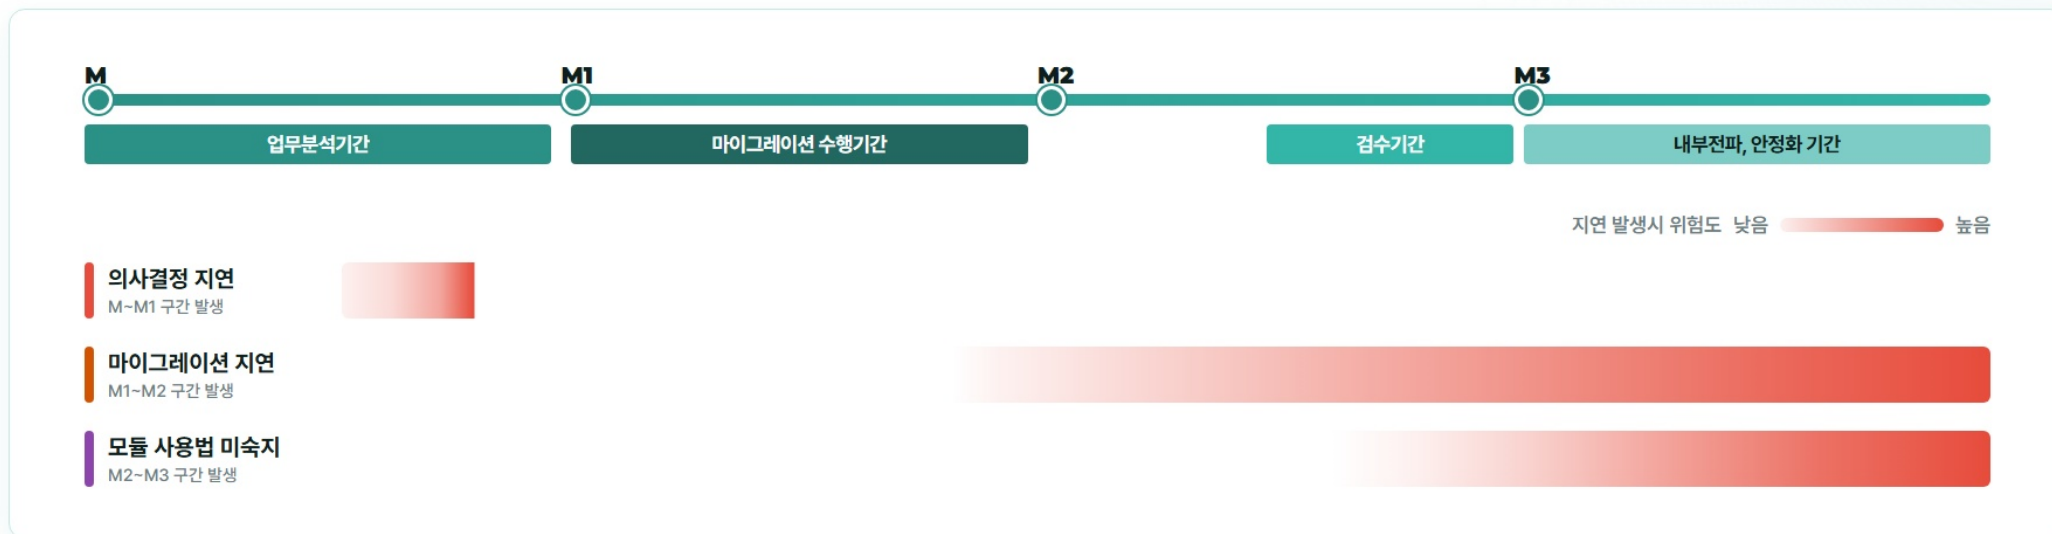

발생 리스크 별 대처 방안

리스크 유형	대처방안
● 의사결정 지연	의사 결정 확정 일자 (개발 및 세팅 완료 전) 까지 확정기한 안내. 기한 경과 후 디폴트 세팅 진행.
● 마이그레이션 지연	지연 발생 기간 별 지연 통지 안내 (지연 발생 3주 이후 주 1회 통보, 12주 이후 일 단위 통보)
● 모듈 사용법 미숙지	검수 기간 내 사용자가 직접 안내에 따라 검수 진행 하므로, 최종 모듈 교육 및 실습 기회 제공.

감사합니다.

JADE by **HCG**

 **Simpac**
